




Planning Prévisionnel RD925

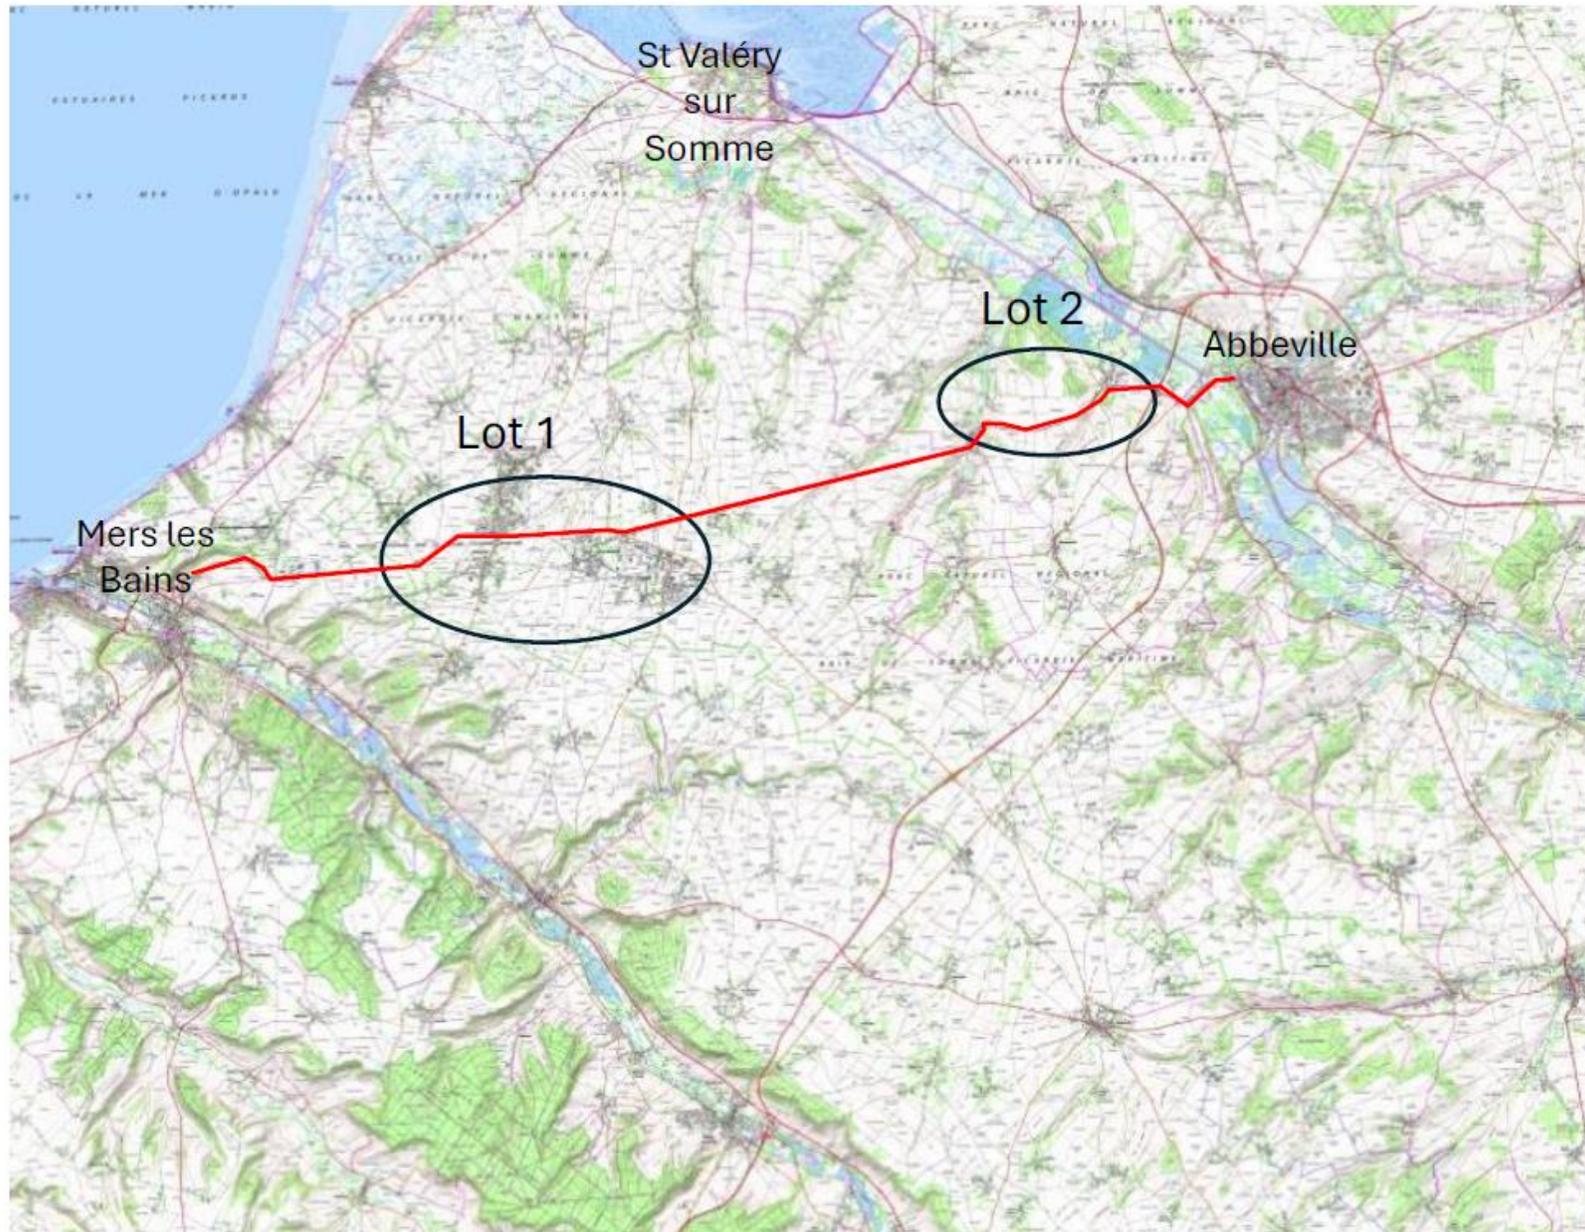

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 1

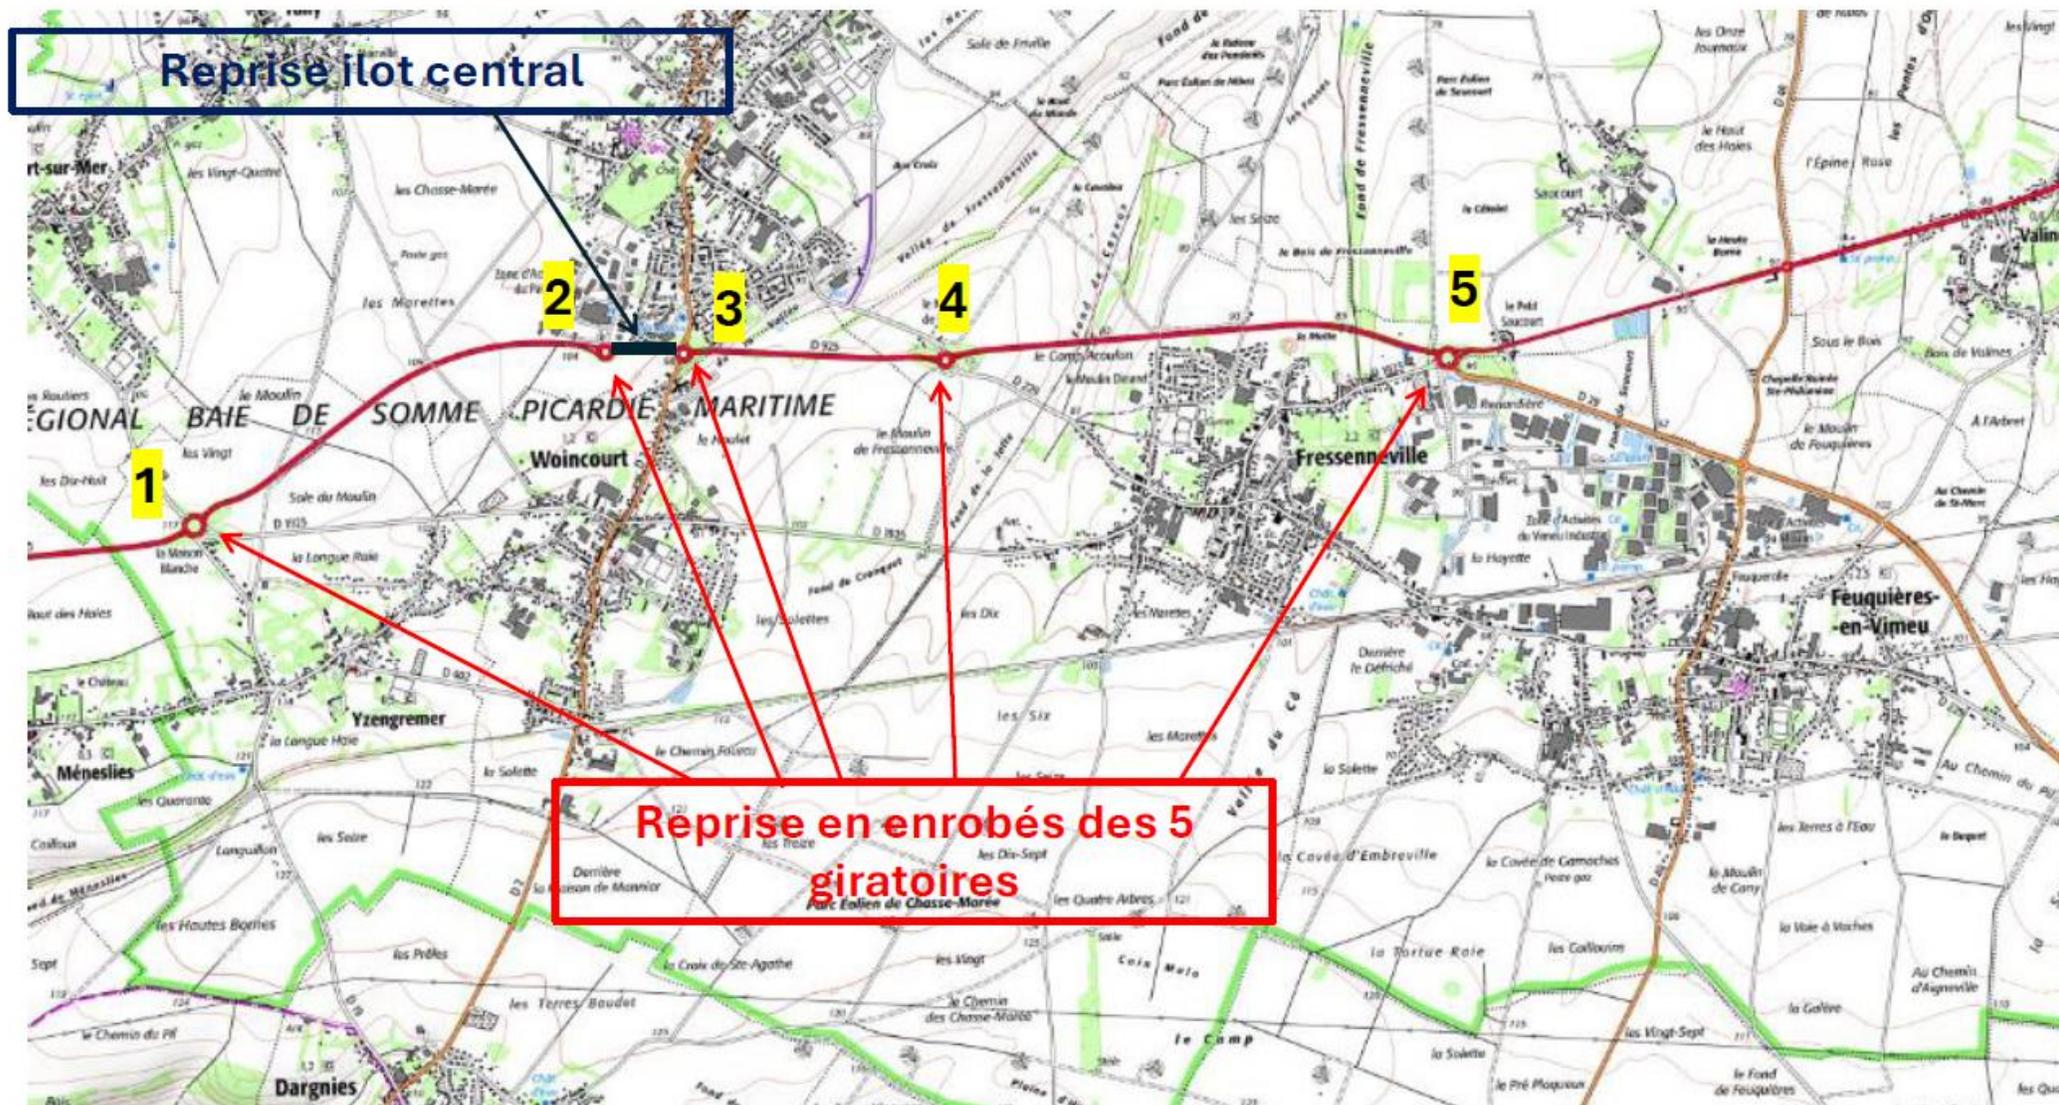

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 1

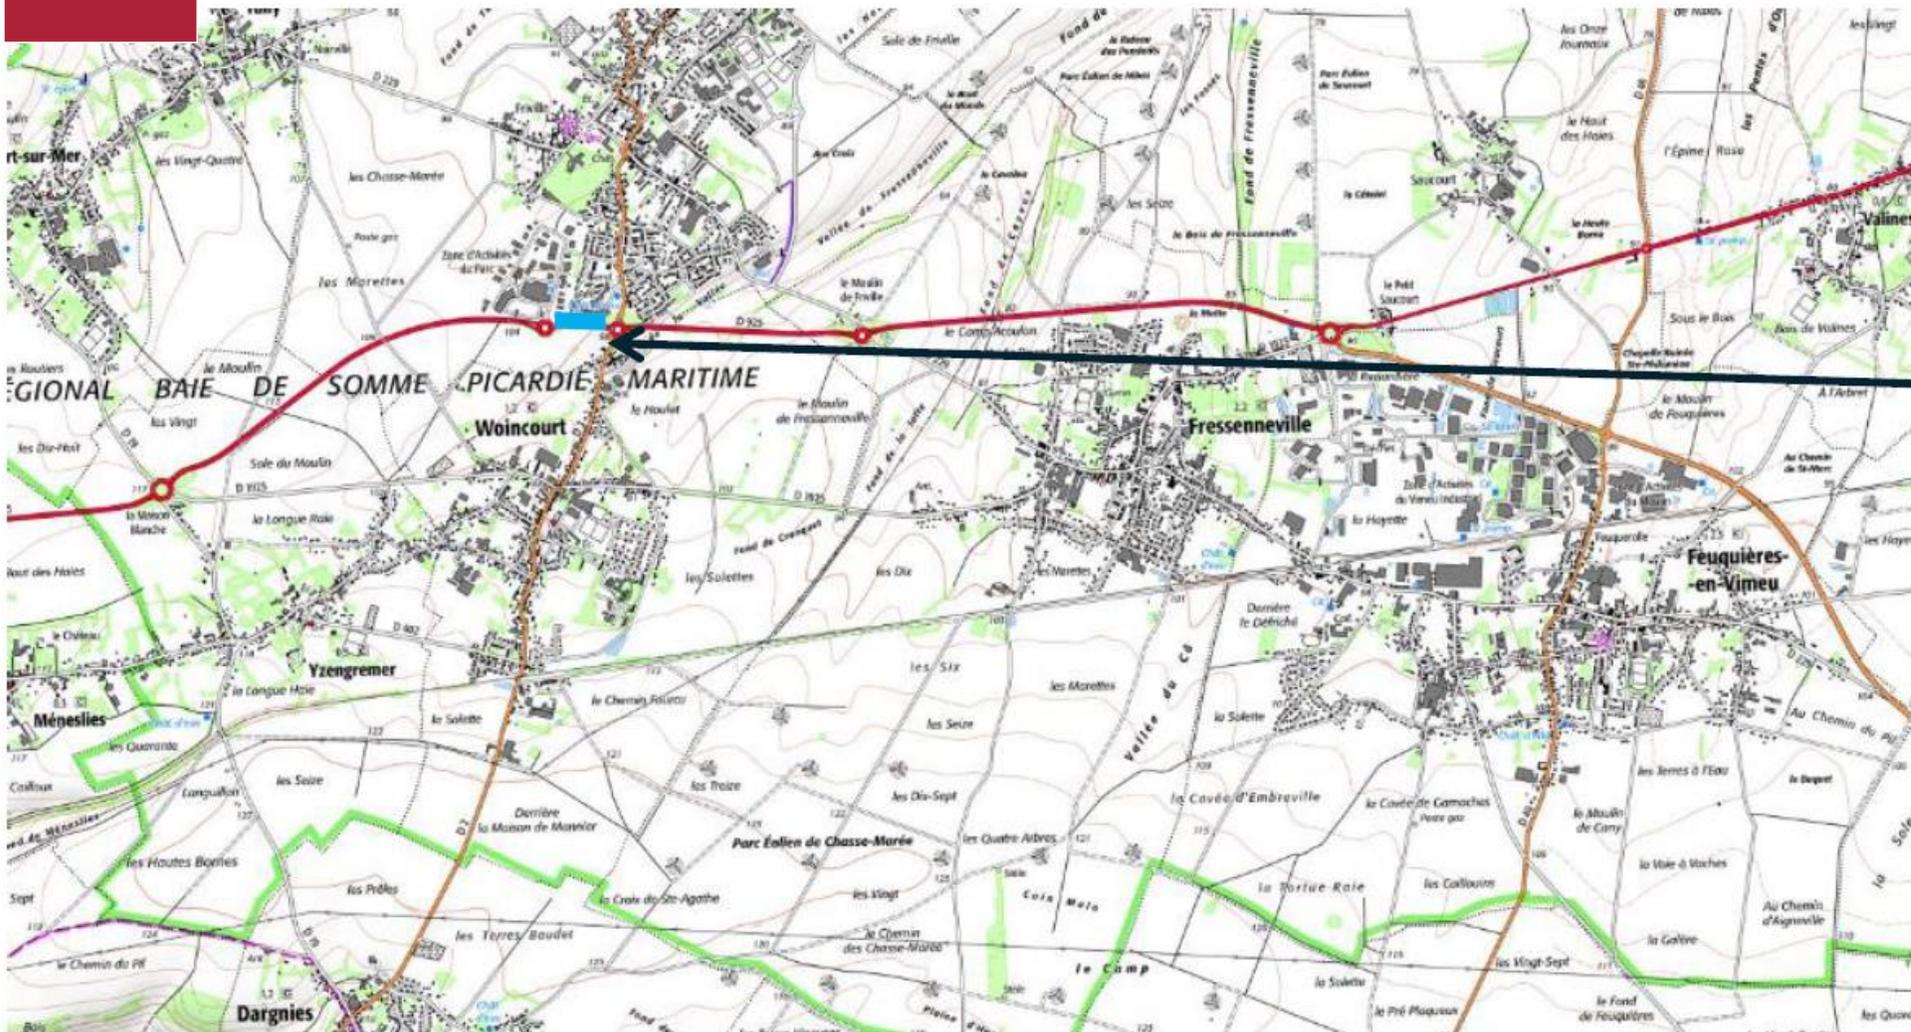

Route barrée entre les 2 giratoires

Du 4/11 au 15/11 24h/24


Les giratoires restent en service

Modification du terreplein central

Novembre

Semaine 45							Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48						
L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 1

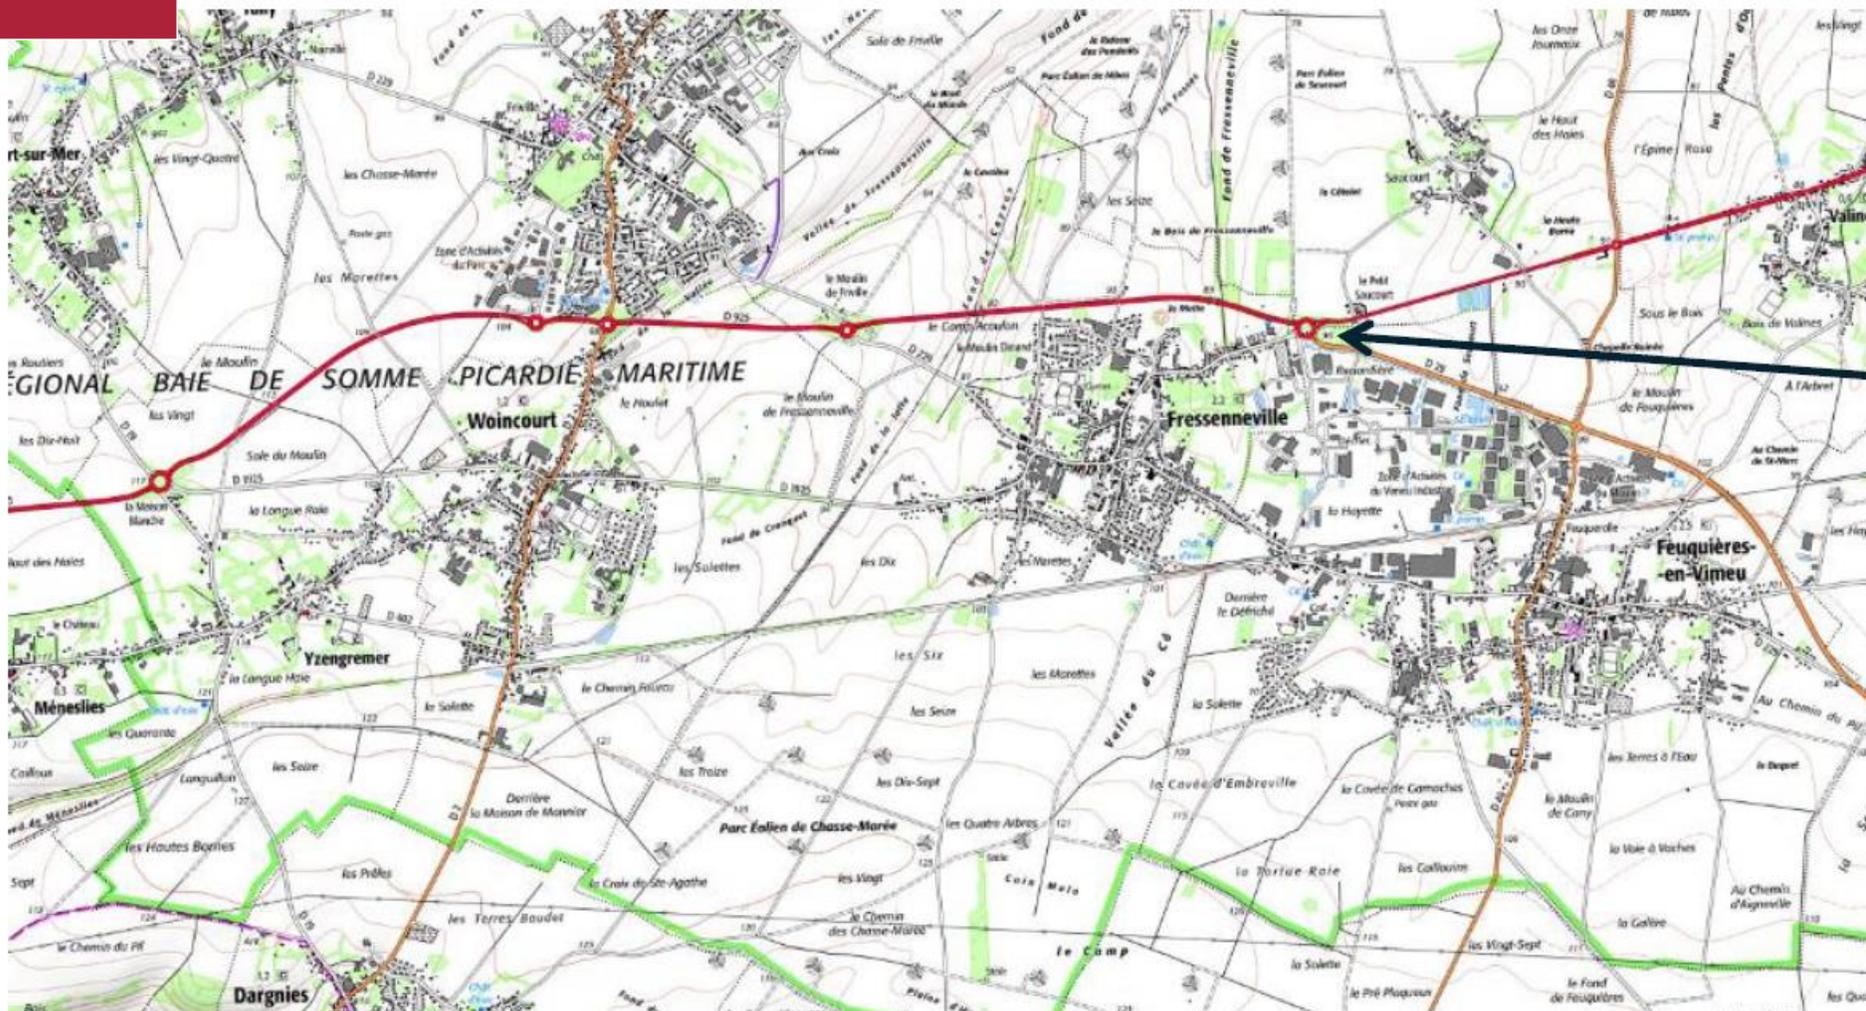

Route barrée sur le giratoire 5

Rabotage giratoire et branches attenantes

Du 14/11 au 15/11 de 19h à 6h

Application enrobés et marquage au sol giratoire et branches attenantes


Du 15/11 au 16/11 de 19h à 6h

Réouverture à la circulation chaque matin

Novembre

Semaine 45							Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48						
L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
					X	X						X	X						X	X						X	X

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 1

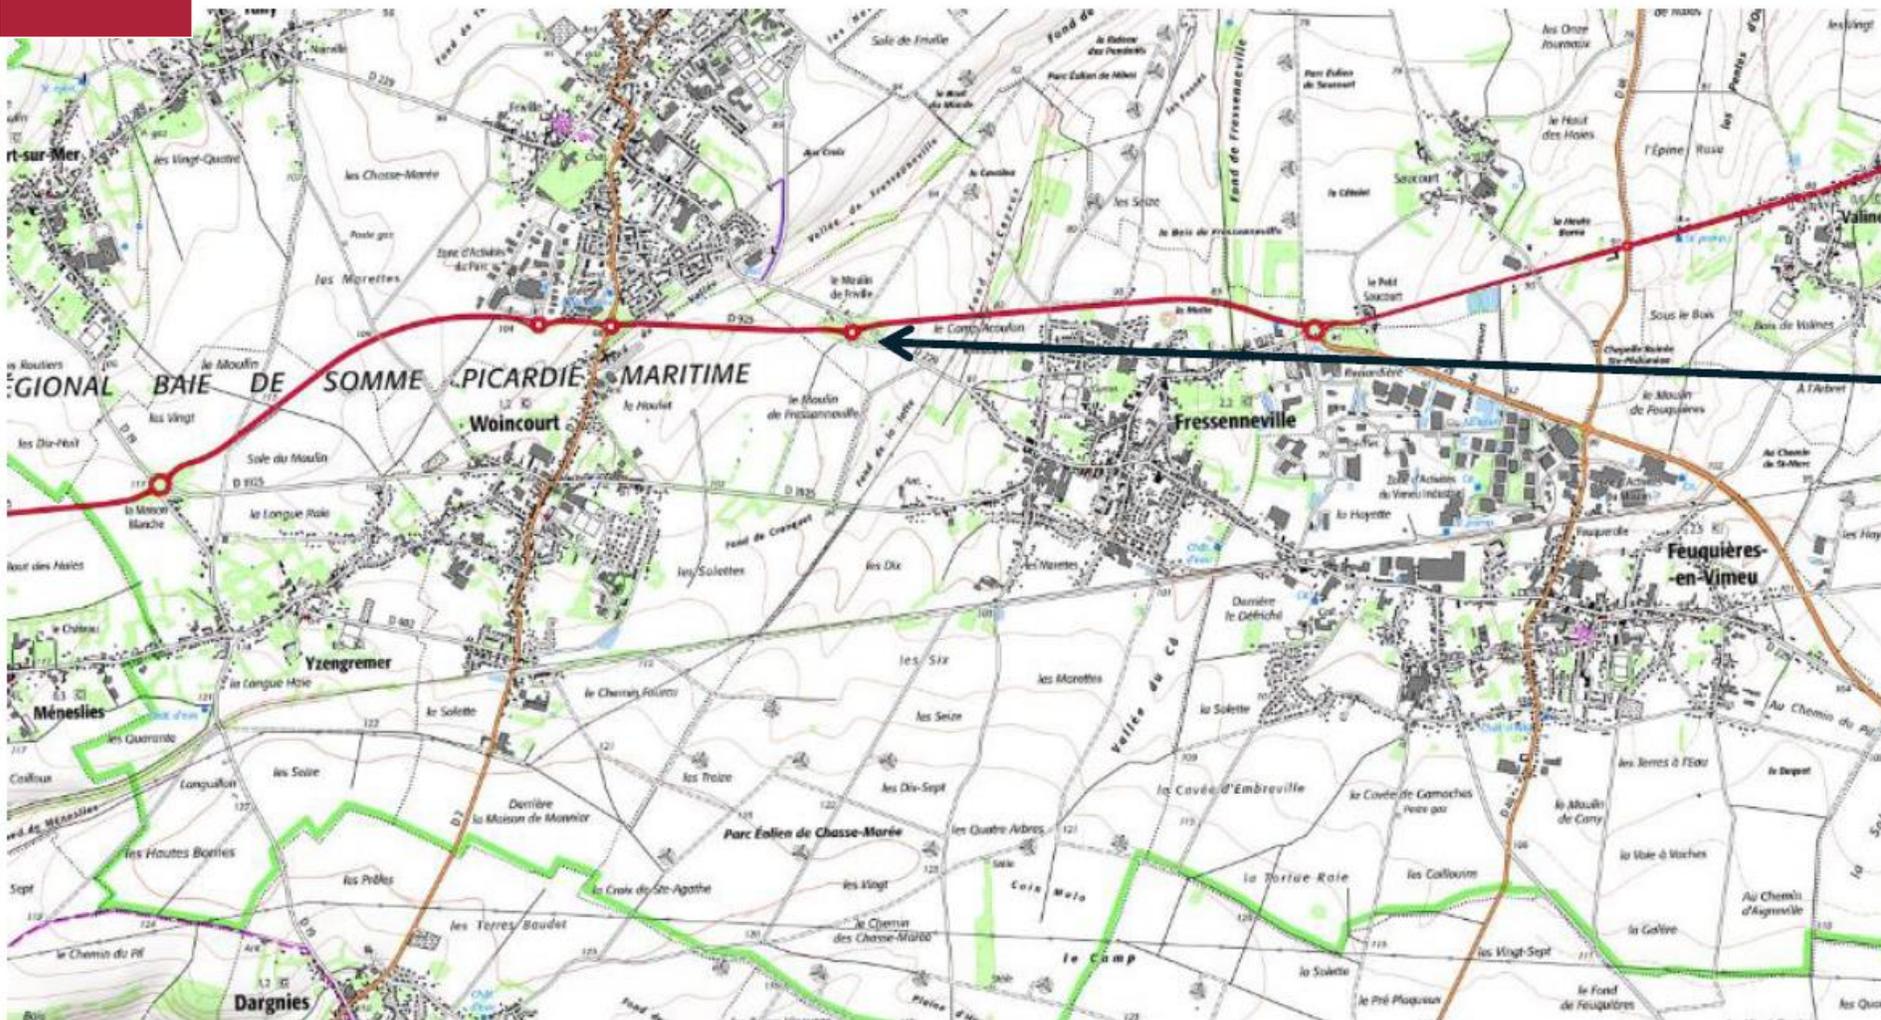

Route barrée sur le giratoire 4

Rabotage giratoire et branches attenantes

Du 15/11 au 16/11 de 19h à 6h

Application enrobés et marquage au sol giratoire et branches attenantes


Du 18/11 au 19/11 de 19h à 6h

Réouverture à la circulation chaque matin

Novembre

Semaine 45							Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48						
L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 1

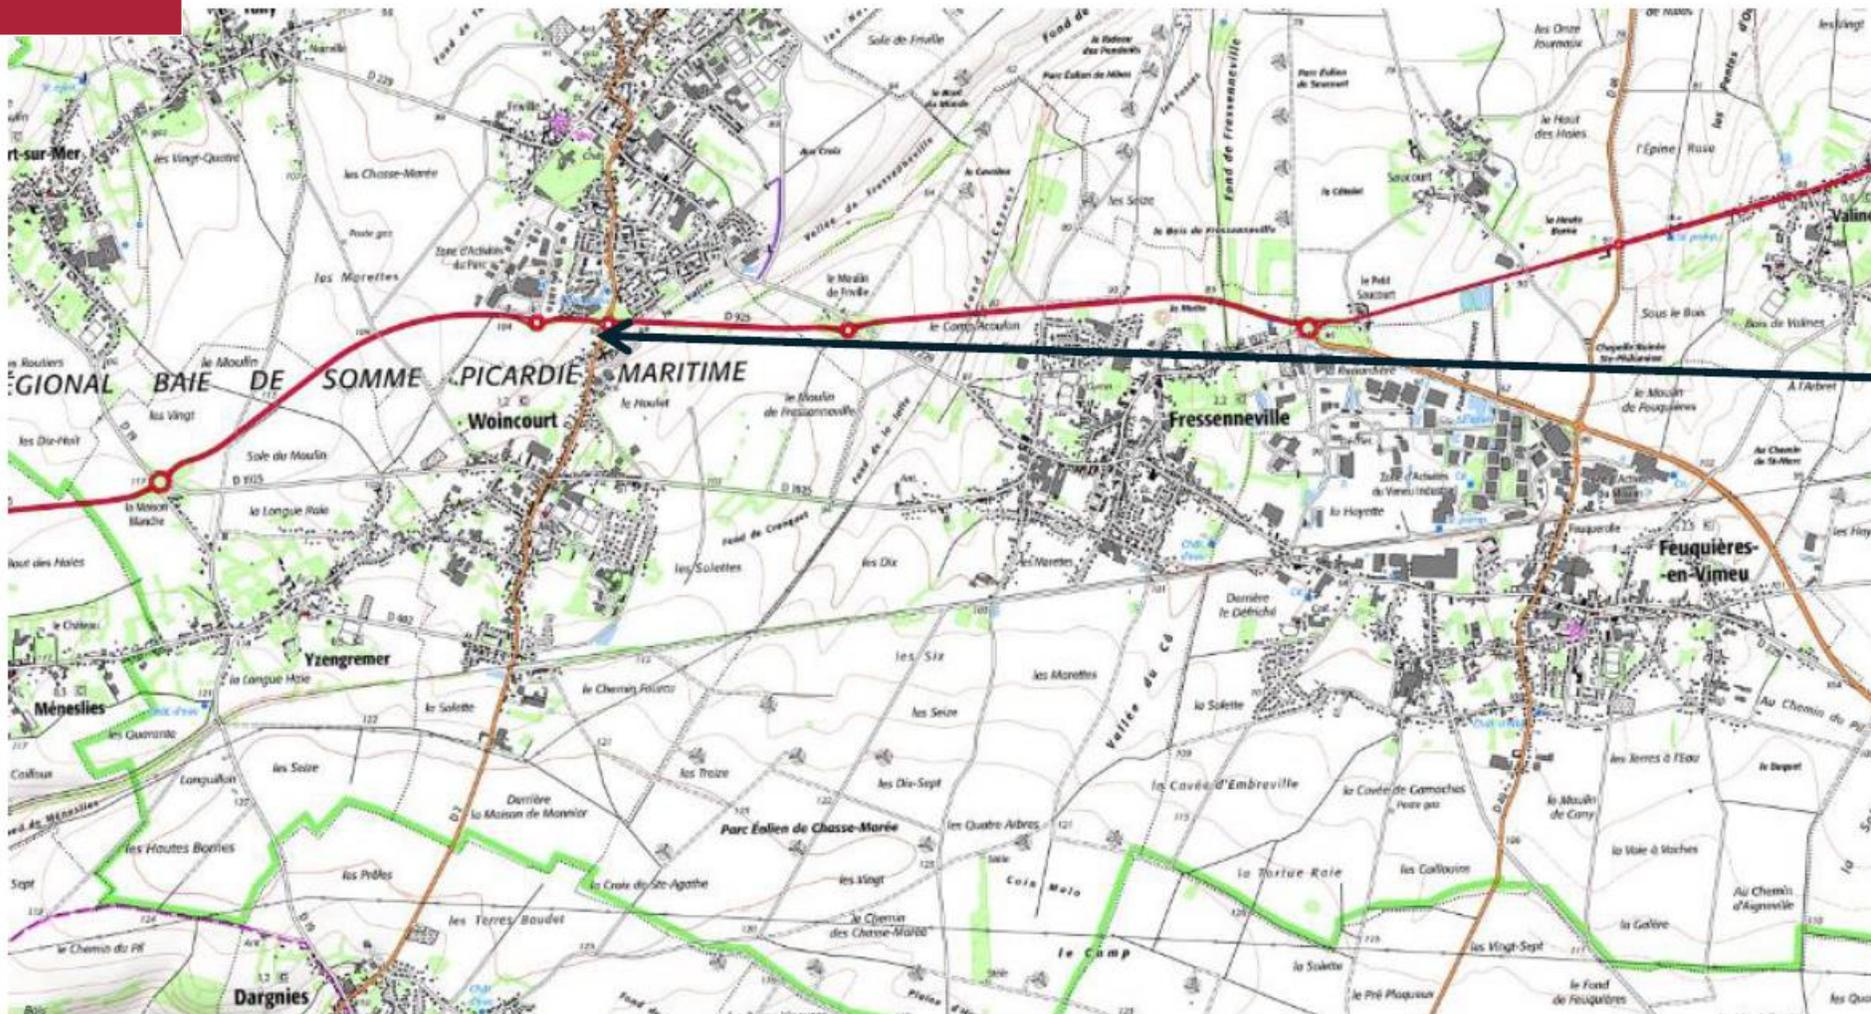

Route barrée sur le giratoire 2 et 3

Rabotage giratoire et branches attenantes

Du 18/11 au 19/11 de 19h à 6h

Application enrobés et marquage au sol giratoire et branches attenantes

Du 19/11 au 20/11 de 19h à 6h


Du 20/11 au 21/11 de 19h à 6h

Réouverture à la circulation chaque matin

Novembre

Semaine 45							Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48						
L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 1

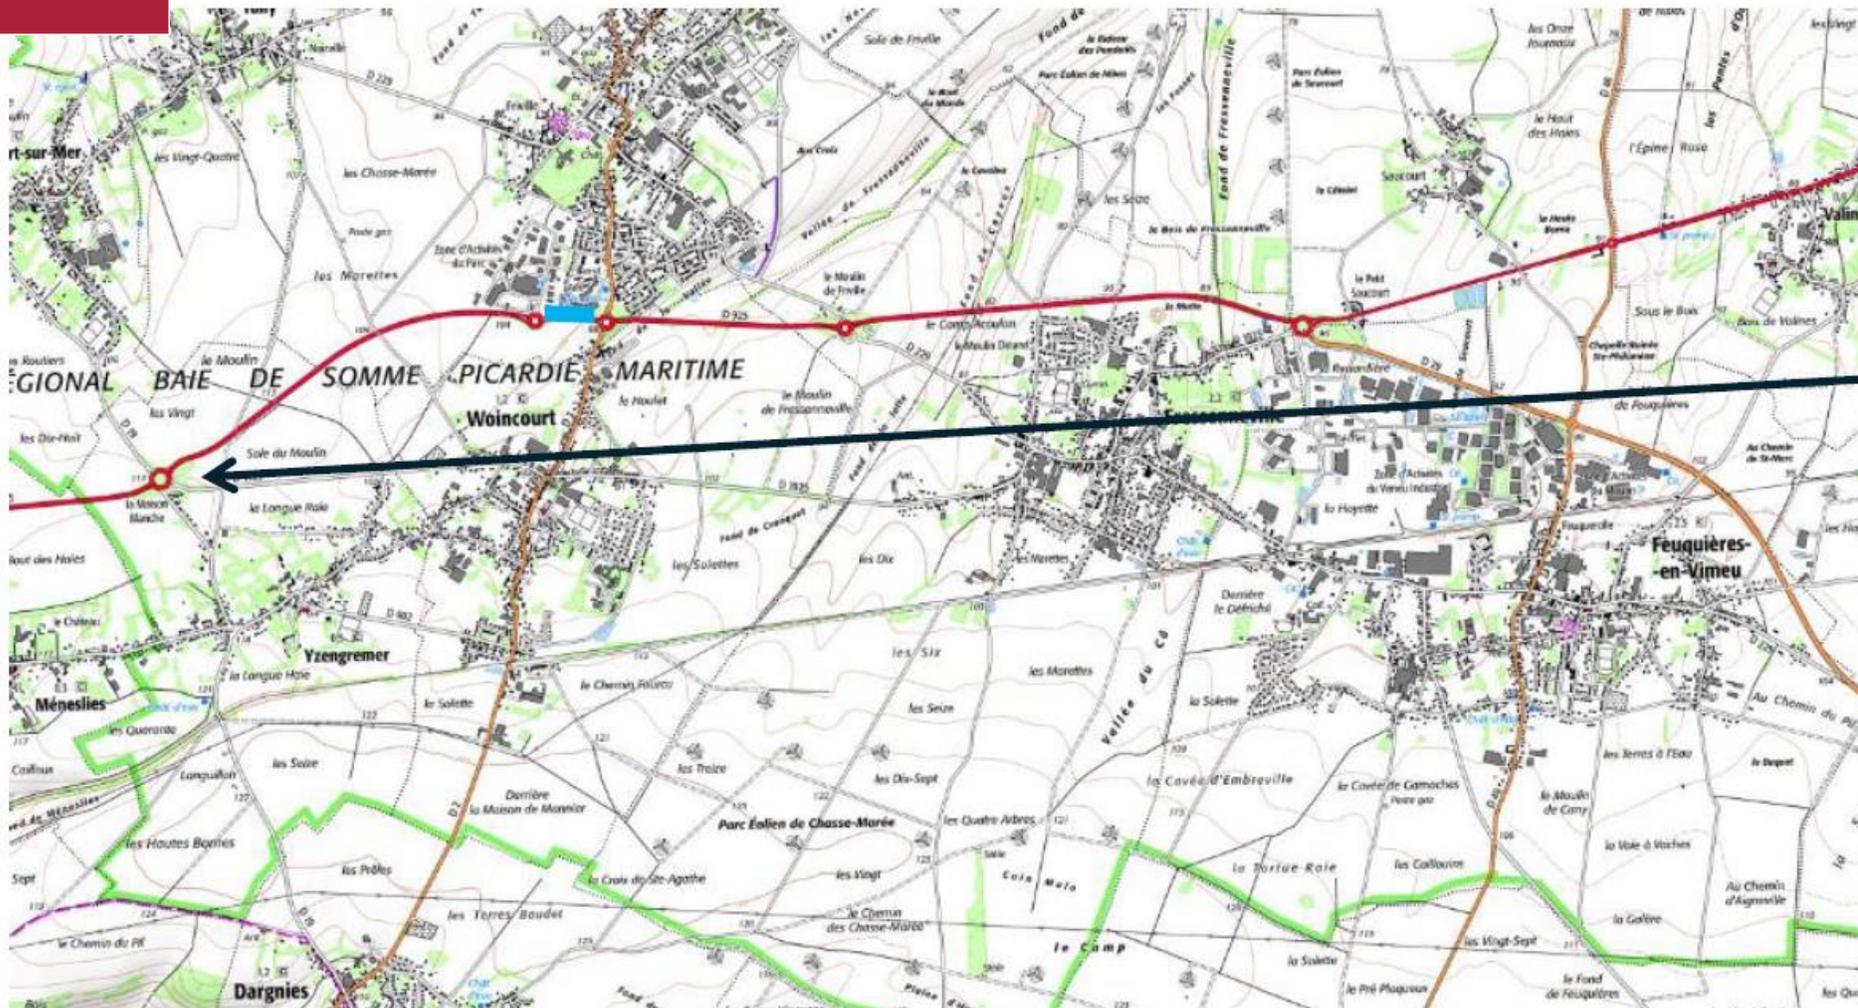

Route barrée sur le giratoire 1

Rabotage giratoire et branches attenantes:

Du 19/11 au 20/11 de 19h à 6h

Application enrobés et marquage au sol giratoire et branches attenantes:

Du 21/11 au 22/11 de 19h à 6h


Du 22/11 au 23/11 de 19h à 6h

Réouverture à la circulation chaque matin


Novembre

Semaine 45							Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48						
L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
					X	X						X	X						X	X						X	X

Planning Prévisionnel RD925 – Lot 2

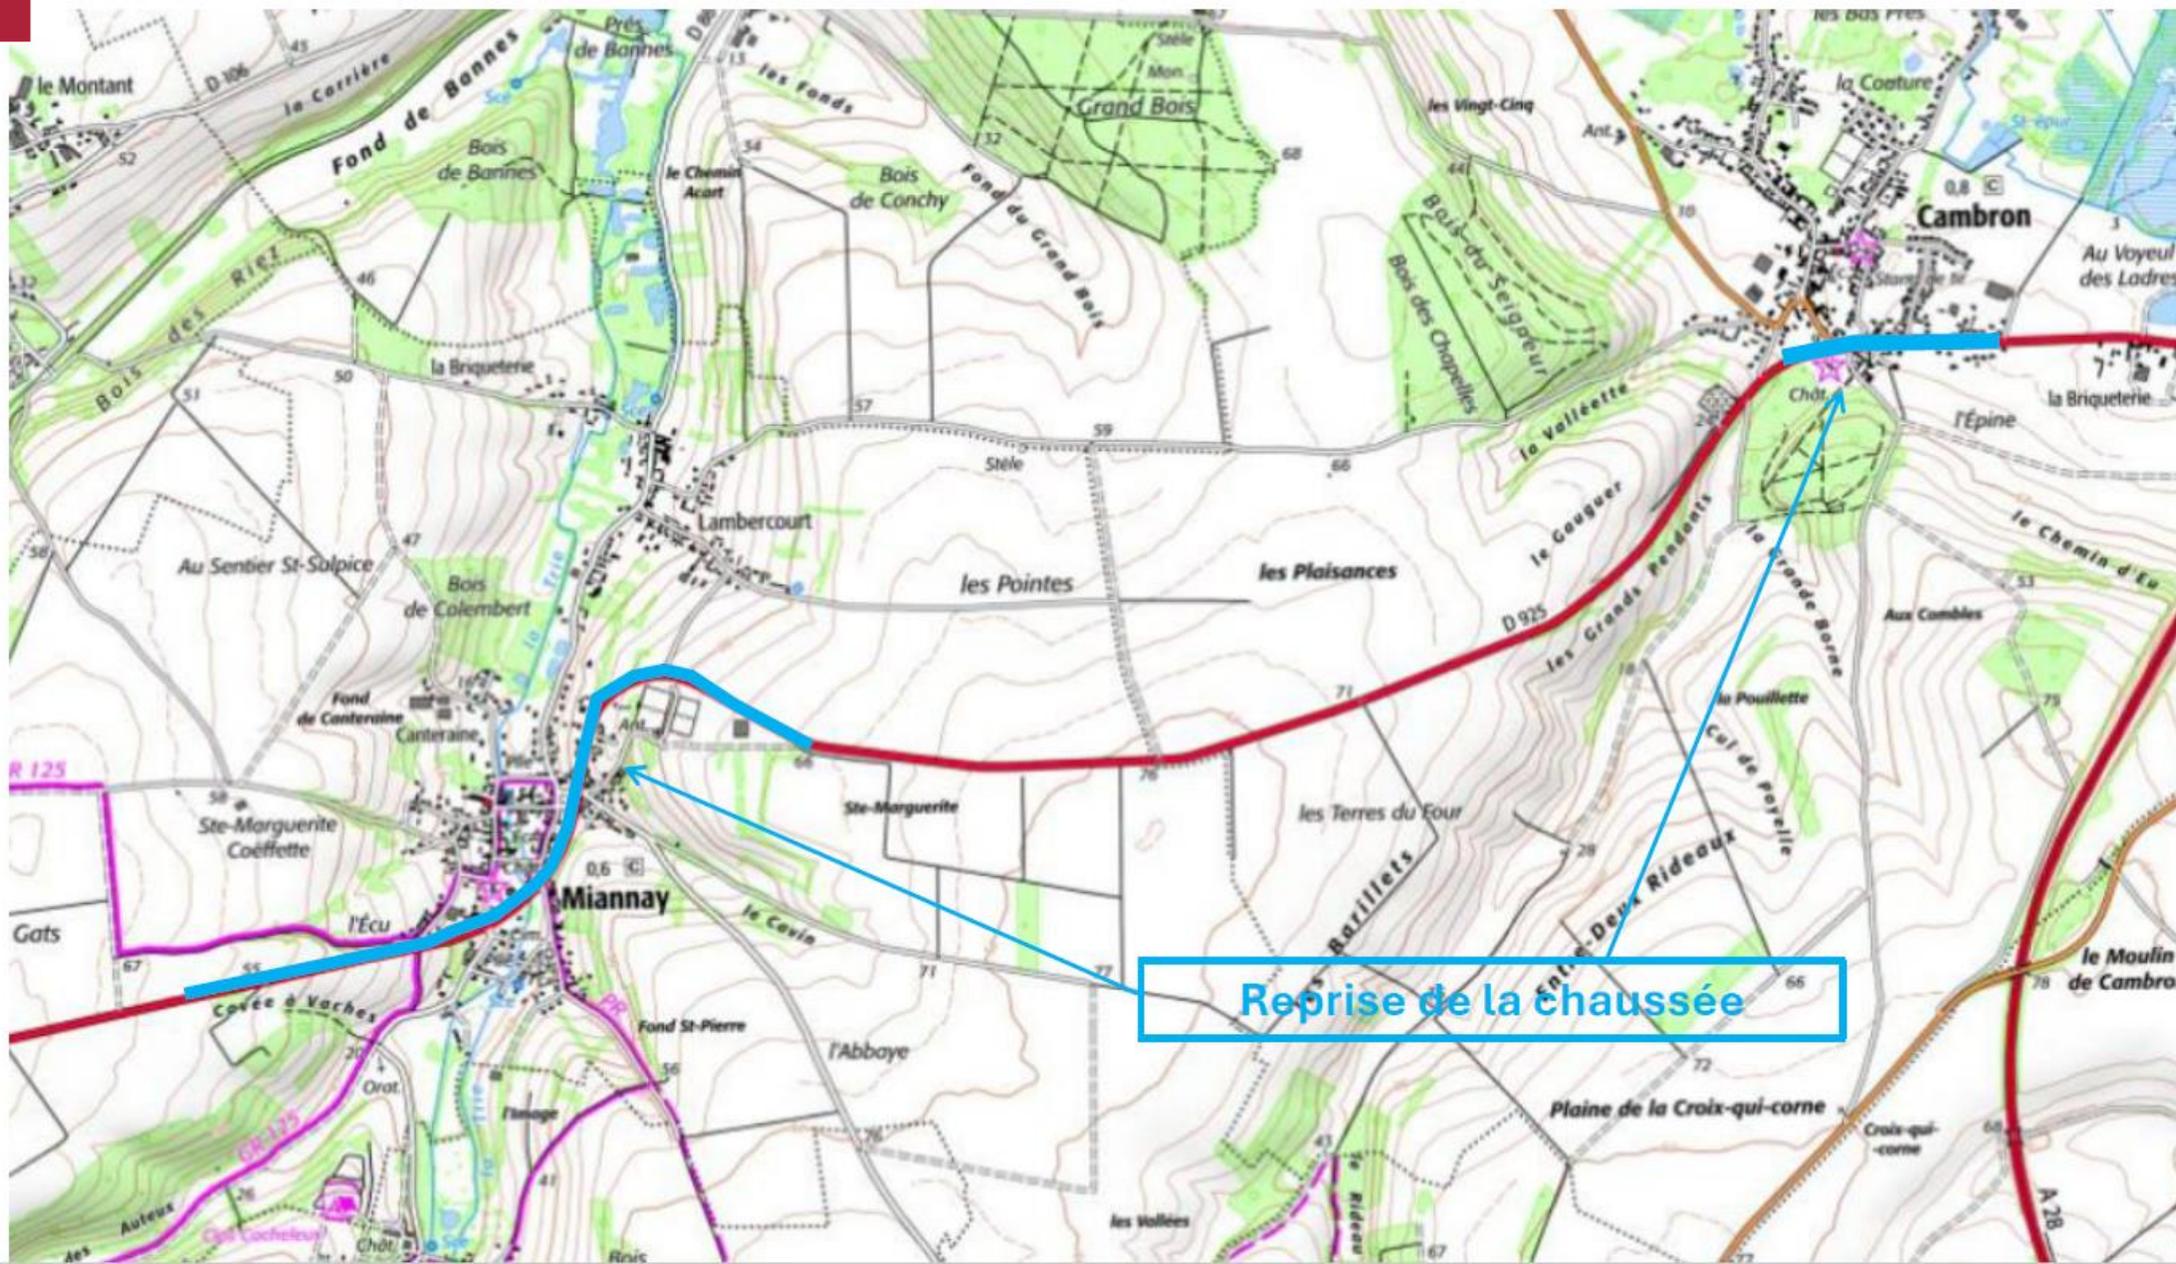

Planning Prévisionnel RD925

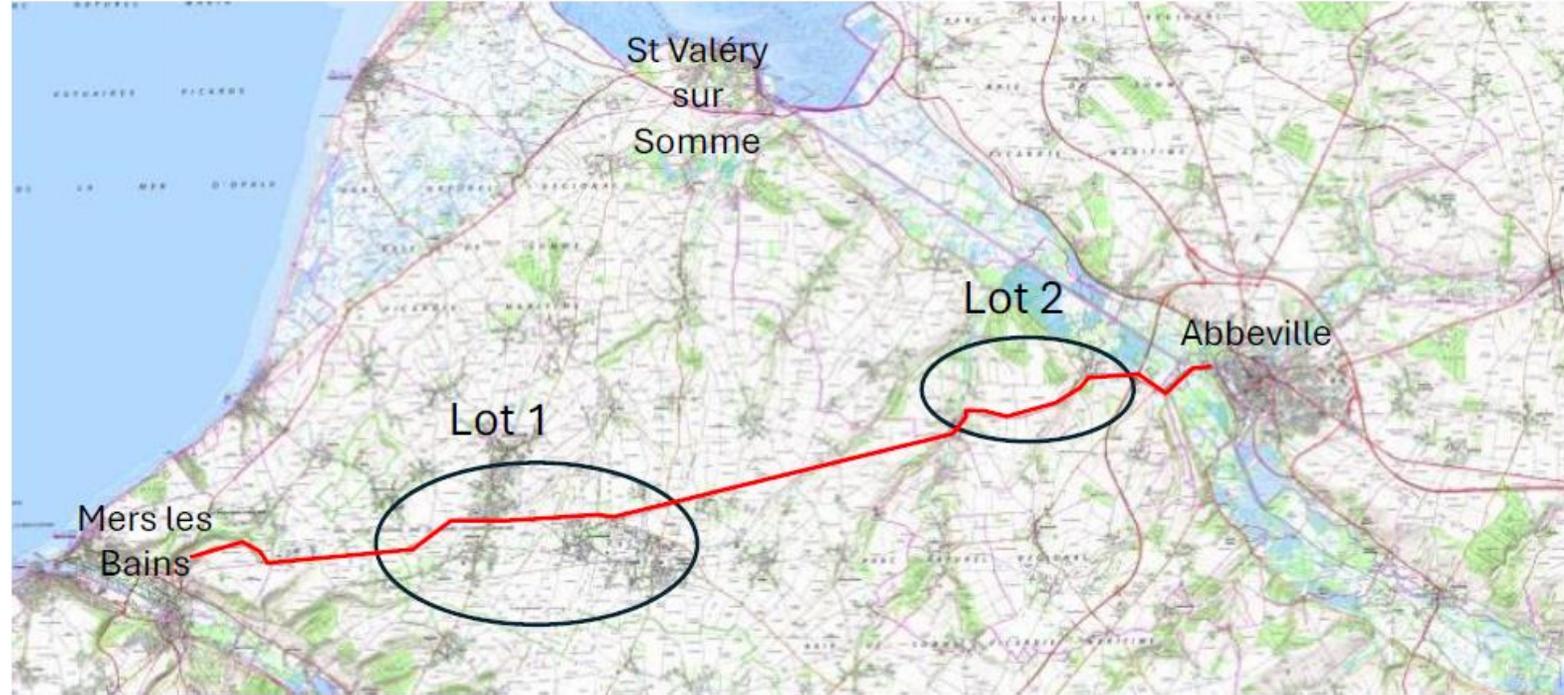

		Novembre																											
		Semaine 45							Semaine 46							Semaine 47							Semaine 48						
		L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D	L	M	m	J	V	S	D
Nombre calendaire		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
Travaux TPC Friville de jour	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Travaux robotage Fressenneville de nuit	1													■	■														
Travaux enrobés Fressenneville de nuit	1															■	■												
Travaux robotage Freuquière de nuit	1											■	■																
Travaux enrobés Freuquière de nuit	1												■	■															
Travaux robotage Friville de nuit	1															■	■												
Travaux enrobés Friville de nuit	2																■	■	■	■									
Travaux robotage Yzengremer de nuit	1																	■	■										
Travaux enrobés Yzengremer de nuit	2																		■	■	■								
Travaux robotage Cambron de jour	0,5																						■						
Travaux enrobés Cambron de jour	1																							■	■	■			
Travaux robotage Miannay de jour	1,5																						■	■	■	■			
Travaux purges GB Miannay de jour	0,5																								■				
Travaux enrobés Miannay de jour	2																									■	■	■	
